	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> PA-GD-FO-08	<b>F.A:</b> 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 1 de 10

## **ESTUDIO PREVIO**

### **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS"**

**FECHA:** 02 DE ENERO DE 2017

#### **NECESIDAD:**

Después de ejecutar la Primera Etapa de Comuneros correspondiente a Urgencias, es necesario complementar estos servicios adecuando y construyendo las áreas para Hospitalización, Esterilización, Farmacia, Vacunación y Lavandería en la Unidad Básica.

#### **DEFINICIÓN TÉCNICA:**

El proyecto que se debe realizar esta basado en la siguiente necesidad encontrada:

- Falencias en las áreas correspondientes a la zona de: Hospitalización, Esterilización, Farmacia, Vacunación y Lavandería en la Unidad Básica.

#### **HOSPITALIZACIÓN**

Acceso continuación del área de Urgencias, encontrando el área de habitación de aislados con su respectiva batería sanitaria y acceso según normatividad vigente, Área Estación de Enfermería de Hospitalización que cuenta con las áreas de baño, trabajo limpio, trabajo sucio, ropa limpia, ropa sucia, depósitos de medicamentos; habitación de Hospitalización Niños de 4 camas con su respectiva batería de Baños, hospitalización mujeres con 4 camas con su respectiva batería de baño y área de ventilación, hospitalización hombres con 4 camas y su respectiva batería de baños, área de ventilación. Hall de comunicación a urgencias y consulta externa.

#### **ESTERILIZACIÓN**

Acceso directo del Hall de consulta Externa con las siguientes áreas:

Área recibo de material, lavado de material, secado instrumental, preparación paquetes, área Autoclave esterilización, depósito de material estéril con ventana de entrega hacia el hall de hospitalización y urgencias, área baño vestir, y área de aseo.

#### **VACUNACION**

Se adecuara el área para vacunación en la zona de consulta externa


#### **FARMACIA**

Se adecuara el área para farmacia con su respectivo servicio sanitario.

#### **AREA DE LAVANDERIA Y PLANCHA**

Se adecuara el área para lavandería y planchado en la zona Servicios generales.

- Se Suministrará e instalará la red eléctrica correspondiente a la Zona de Hospitalización, Esterilización, Vacunación, Farmacia y Servicios Generales.
- Se suministrará e instalará el cableado estructurado correspondiente a la Zona de Hospitalización, Esterilización, Vacunación y Farmacia.
- Se suministrará e instalará el llamado de enfermeras correspondiente a la Zona de Hospitalización.

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> PA-GD-FO-08	<b>F.A:</b> 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 2 de 10

- Se suministrará e instalará la red de Oxígeno correspondiente a la Zona de Hospitalización.

Por tal razón la Gerencia de la Empresa Social del Estado IMSALUD ordena la ejecución y proceso contractual para la “**ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS.**”

## 2. RESULTADOS ESPERADOS

Relacione los resultados finales y de medio que se obtendrán al ejecutar el proyecto.

Programa de Gestión Social	Proyecto	Indicador	Resultado a la fecha	Proyección a fin de año
Prestación y dotación del Servicio de Hospitalización, Partos, Esterilización y la adecuación de las áreas de Vacunación, Farmacia y lavado	Adecuación y Construcción II Etapa Unidad Básica de Comuneros	M2 Construidos	0	100

## POBLACIÓN BENEFICIARIA

DPTO	MUNICIPIO	NUMERO DE BENEFICIARIOS A CIERRE DE AÑO	NUMERO DE BENEFICIARIOS ESTIMADOS EN ÁREA DE INFLUENCIA	DESCRIPCIÓN (Identificar la población beneficiaria que obtiene las ventajas y beneficios del Proyecto)
Norte de Santander	San José de Cúcuta	52915	82073	Familias Comunidades ubicadas en el barrio Comuneros


## GENERALIDADES


Teniendo en cuenta los 217.000 habitantes, pertenecientes a la comuna No.7, donde se encuentra ubicada la UNIDAD BASICA DE COMUNEROS, la cual, en la actualidad no cuenta con una infraestructura apropiada para la prestación de servicios de Salud, debido a que su infraestructura física y sus instalaciones no tienen las áreas requeridas para la alta demanda de usuarios, es así, que se hace necesario realizar “CONSTRUCCION ADECUACIÓN Y ADQUISICION EQUIPOS BIOMEDICOS Y DOTACION BASICA UBA COMUNEROS”, para garantizar el desarrollo de la misión de la Empresa Social del Estado IMSALUD.

- Que la misión de la Empresa Social del Estado IMSALUD es cumplir con la prestación del servicio de salud de baja complejidad y con la normatividad vigente, desarrollando con eficiencia, eficacia y efectividad las políticas de calidad de la Empresa.

## Descripción del proyecto

- **Localización (Mapa o plano de ubicación del proyecto)**

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> PA-GD-FO-08	<b>F.A:</b> 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 3 de 10

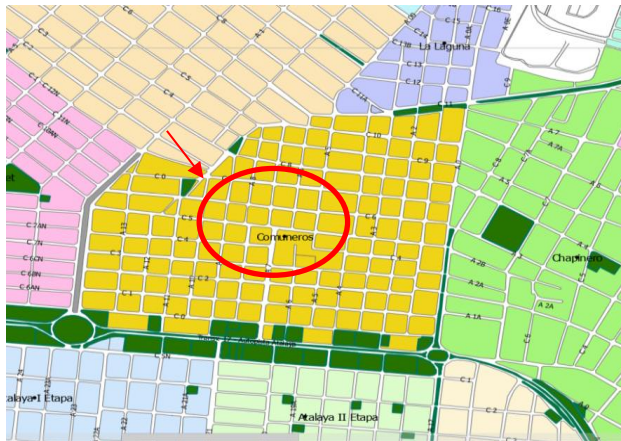

DIRRECCION: Calle 5 # 5-29 barrio Comunerros.

- **Características del proyecto:**  
El proyecto a ejecutar dentro del objeto del contrato son las siguientes áreas:

### HOSPITALIZACION


- Área para habitación de aislados con su respectiva batería sanitaria
- Área Estación de Enfermería de Hospitalización con los servicios de: baño, trabajo limpio, trabajo sucio, ropa limpia, ropa sucia, depósitos de medicamentos
- Área para habitación de Hospitalización Niños de 4 camas con su respectiva batería de Baños
- Área para habitación de Hospitalización mujeres con 4 camas con su respectiva batería de baño
- Área para habitación de Hospitalización hombres con 4 camas y su respectiva batería de baños
- Áreas para ventilación
- Hall de comunicación a urgencias y consulta externa.

### ESTERILIZACIÓN

- Área recibo de material
- Área para lavado de material
- Área secado instrumental
- Área preparación paquetes
- Área para Autoclave esterilización
- Depósito de material estéril con ventana de entrega hacia el hall de hospitalización y urgencias
- Área baño vestir
- Área de aseo

### PARTOS

- Área recepción y entrega pacientes
- Área para trabajo de partos con su respectiva batería de baño
- Área para sala de partos
- Área para desechos patógenos
- Área para atención al recién nacido
- Área para vestier medico con su respectiva batería de baño
- Área para lavamanos quirúrgico
- Área para puerperio con su respectiva batería de baño
- Área para depósito de aseo
- Área deposito – varios

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> PA-GD-FO-08	<b>F.A:</b> 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 4 de 10

## VACUNACION

- Área para vacunación(adequación)

## FARMACIA

- Área para farmacia (adequación)

## LAVANDERIA

- Área para lavandería y planchado (adequación)

Los ítems más representativos del proyecto son:

- Capítulo de Estructuras
- Capítulo de Cubierta
- Capítulo de Instalaciones
- Capítulo de revestimiento para muros
- Capítulo de revestimiento para piso
- Redes generales

## Comentarios al desarrollo del proyecto:

Se destacan las siguientes observaciones durante la ejecución de las obras o el desarrollo del convenio:

- **Aspectos Técnicos:**

Se entrega designación de la Ing. KAROL CARDENAS CONTRERAS como supervisora por parte del ejecutor IMSALUD.


Se contrata a un profesional en la construcción para la Interventoría de Obra.

## ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN


A la fecha no se han iniciado las actividades de obra, se están adelantando las actividades de selección de contratista e interventoría. Tendrán el siguiente cronograma:

### 1. CRONOGRAMA DE CONTRATO DE OBRA.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Convocatoria a Veedurías Ciudadanas	30 de Diciembre de 2016.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> , y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Publicación Aviso Convocatoria.	30 de Diciembre de 2016.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> <b>PA-GD-FO-08</b>	<b>F.A:</b> 19-12- <b>2014</b>
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 5 de 10


Publicación y consulta Estudios Previos	30 de Diciembre 2016.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Publicación y consulta Pre Pliegos de Condiciones.	Del 30 de diciembre de 2016 al 02 de Enero de 2017.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Observaciones a los Pre pliegos.	Del 02 al 03 de Enero de 2017, Hasta las 2:00 p.m.	Oficina de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta. Correo <a href="mailto:interventoria@imsalud.gov.co">interventoria@imsalud.gov.co</a>
Publicación respuestas a observaciones al proyecto de Pre pliegos de condiciones.	Del 03 al 04 de Enero de 2017, Hasta las 5:00 p.m.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Audiencia de revisión de la asignación de riesgos.	05 de Enero de 2017. A las 9:30 a.m.	Oficina de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Resolución de apertura del proceso de contratación.	06 de Enero de 2017	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Publicación de pliegos de condiciones definitivos.	10 de Enero de 2017.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> <b>PA-GD-FO-08</b>	<b>F.A:</b> 19-12- <b>2014</b>
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 6 de 10

Visita al sitio de la obra de carácter obligatorio	11 de Enero de 2017, a las 8:00 a.m.	En el sitio de la obra.
Audiencia de aclaración y alcance de los pliegos de condiciones y distribución de riesgos.	11 de Enero de 2017, a las 2:00 p.m.	En la oficina del Jefe de Servicios Generales y de Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14, primer piso, del municipio de San José de Cúcuta.
Plazo máximo para expedir adendas.	11 de Enero de 2017, hasta las 6:00 p.m.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Cierre del proceso licitatorio y entrega de propuestas.	Para presentar ofertas se tendrá el horario de oficina desde la fecha de apertura del proceso hasta el 17 de Enero del 2017, a las 4:00 p.m.	Oficina del Jefe de Servicios Generales y de Suministros, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14, segundo piso, del municipio de San José de Cúcuta.
Evaluación de propuestas.	Del 18 de Enero al 24 de Enero de 2017, a las 4:00 pm	Comité Evaluador de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Publicación del informe de evaluación y traslado.	25 de Enero de 2017.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Plazo límite para subsanar documentos.	25 de Enero de 2017. Hasta las 5:30 p.m.	Oficina de Jefe de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Observaciones al informe del Comité Evaluador	25 y 26 de Enero de 2017.	Oficina de Jefe de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar,

6

**Comercial Bolívar Bloque C Local 14**  
**TEL 5 82 70 07- FAX 5 84 30 31**  
**Municipio San José de Cúcuta - Norte de Santander**

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> PA-GD-FO-08	<b>F.A:</b> 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 7 de 10

		Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Traslado al Comité Evaluador, de las observaciones presentadas.	Del 27 al 31 de Enero de 2017.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Recalificación de darse el caso.	31 de Enero de 2017.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Acto Administrativo de adjudicación y publicación de la Resolución de adjudicación.	01 y 02 de Febrero de 2017.	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, oficina Gerente de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Firma de Acta de Inicio de Obra	09 de Febrero de 2017.	Carpeta Proceso Contractual.
Firma de Acta de Recibo de Obra	09 de Agosto de 2017.	Carpeta Proceso Contractual.
Firma de Acta de Liquidación de Obra	27 de Octubre de 2017.	Carpeta Proceso Contractual.

**Información general del Contrato de Obra:**

**Objeto:** ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS.

**Modalidad de Contrato:** Contratación Pública - Proceso de Solicitud Pública


**Duración de la Obra:** SEIS (6) MESES.

**Inicio de Contrato:** 09 de Febrero de 2017

**Final de Contrato:** 09 de Agosto de 2017

**Garantías:**

- A) Cumplimiento
- B) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones,
- C) Estabilidad de obra
- D) Responsabilidad extracontractual

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> <b>PA-GD-FO-08</b>	<b>F.A:</b> 19-12- <b>2014</b>
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 8 de 10

**Control de calidad de la Obra.**

Realizar una recepción y almacenamiento ordenado de los materiales en obra.

Revisar que los materiales utilizados y los equipos instalados cumplen los estándares previstos y las normas de aplicación e instalación.

Verificación de Diseño de mezcla.

Realizar Ensayo de asentamiento de concreto.

Realizar Ensayo de compresión a cilindros de concreto endurecido. Las varillas de refuerzo deberán ser sometidas a ensayos de fábrica de acuerdo con las normas aplicables y el contratista debe suministrar una copia certificada de los análisis químicos y físicos realizados por la fábrica para cada lote con el número de identificación de refuerzo que se utilizara en obra.

Las áreas de placas que serán impermeabilizadas deben realizar pruebas de estanqueidad.

Revisar que los procesos constructivos sean adecuados.

**Objeto:** CORRECTIVOS ELÉCTRICOS COMUNEROS II ETAPA

**Modalidad de Contrato:** Contratación Privada - Proceso de Solicitud Privada

**Duración de la Obra:** SEIS (6) MESES.

**Inicio de Contrato:** 09 de Febrero de 2017

**Final de Contrato:** 09 de Agosto de 2017

**Garantías:**

- A) Cumplimiento
- B) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones,
- C) Estabilidad de obra
- D) Responsabilidad extracontractual

**Control de calidad de la Obra.**


Realizar una recepción y almacenamiento ordenado de los materiales en obra.

Revisar que los materiales utilizados y los equipos instalados cumplen los estándares previstos.

Supervisar las normas de aplicación e instalación de los materiales dentro de los procesos constructivos.

**Objeto:** SUMINISTRO E ISNTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA COMUNEROS II ETAPA

**Modalidad de Contrato:** Contratación Privada - Proceso de Solicitud Privada

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> PA-GD-FO-08	<b>F.A:</b> 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 9 de 10

**Duración de la Obra:** CUATRO (4) MESES.

**Inicio de Contrato:** 09 de Febrero de 2017

**Final de Contrato:** 09 de Junio de 2017

**Garantías:**

- A) Cumplimiento
- B) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones,
- C) Estabilidad de obra
- D) Responsabilidad extracontractual

**Control de calidad de la Obra.**

Realizar una recepción y almacenamiento ordenado de los materiales.

## 2. CRONOGRAMA DE CONTRATO DE INTERVENTORIA.

- Información general del Contrato de Interventoría:

**Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS

**Modalidad de Contrato:** Solicitud Privada

**Duración de la Obra:** SEIS (6) MESES.

**Valor de Contrato de Interventoría Externa:** CINTO SESENTA Y SEIS MILLONES (\$166.000.000,00) DE PESOS MDA/CTE.

**Inicio de Contrato:** 09 de Febrero de 2017

**Final de Contrato:** 09 de Agosto de 2017

**Garantías:**

**A) Cumplimiento** del contrato, que se liquidará por el diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y el de su liquidación.


**B) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones,** por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

**D) Responsabilidad extracontractual** que se liquidara por el 5% del valor del contrato de obra, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales vigentes (200SMMLV) y la vigencia será por el periodo de ejecución del contrato (04 Meses ).

La póliza de garantía única deberá ser expedida por una Compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. Esta garantía se debe entregar a la E.S.E "IMSALUD" dentro del periodo de legalización del contrato, y es requisito esencial para su ejecución

**Actividades desarrolladas por la interventoría:**


- Elaboración de informes técnicos, administrativos y financieros, de evaluación de la ejecución de las obras en sus diferentes Unidades de Obra.

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> <b>PA-GD-FO-08</b>	<b>F.A:</b> 19-12- <b>2014</b>
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 10 de 10

- Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre la materia objeto de contrato.
- Ejercer el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el cumplimiento de normas, especificaciones, procedimientos y demás condiciones contratadas.
- Controlar las etapas del objeto contractual y certificar la prestación del servicio, la entrega de bienes o la ejecución de obras contratadas, cuando el caso así lo amerite.
- Controlar que el contratista cumpla oportunamente con las obligaciones laborales contraídas en desarrollo del contrato, cuando a ello hubiere lugar y según la naturaleza del contrato.
- Formular las recomendaciones que fueren del caso, tendientes a la debida ejecución contractual.
- Informar a la Oficina competente de la ESE IMSALUD cuando se produjeren incumplimientos parciales o totales de las obligaciones derivadas del contrato o de mala calidad de los bienes o servicios contratados.
- Las demás debe procurar el debio cumplimiento oportuno de la ejecución del objeto contractual.

**(Original Firmado)**

**KATHERINE CALABRO GALVIS**  
Gerente  
ESE IMSALUD

 <small>E.S.E. Empresa Social del Estado</small>	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	<b>CODIGO:</b> PA-GD-FO-08	<b>F.A:</b> 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES	<b>VERSION:</b> 1	Página 11 de 10

**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS**

**1. PERSONAL PROFESIONAL**

DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO UTILIZACION (Meses)	OCUPACION	COSTO/MES	SIN FACTOR MULTIPLICADOR	FAC TOR MULT.	CON FACTOR MULTIPLICADOR
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA							
ARQUITECTO Y/O INGENIERO RESIDENTE							
INGENIERO ELECTRICO							
<b>SUB TOTAL PERSONAL</b>							

**2.COSTOS DIRECTOS**

DESCRIPCION	UND	TIEMPO UTILIZACION (Meses)	CANT.	TARIFA MENSUAL	VALOR
ALQUILER DE VEHICULO INCLUYE CONDUCTOR					
ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTOS, PLANOS E INFORMES					
GASTOS DE OFICINA , INCLUYE SERVICIOS , COMPUTADOR, COMUNICACIONES, PERSONAL ADMINISTRATIVO					
<b>SUB TOTAL GASTOS GENERALES</b>					
<b>SUB TOTAL INTERVENTORIA</b>					

**3. IMPUESTOS**

DESCRIPCION	% DE IMPUESTO	VALOR INTERVENTORIA	VALOR IMPUESTO
IVA			
RETENCION EN LA FUENTE			
RETE ICA			
ESTAMPILLA IMRD			
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL			
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO CIENTIFICO			
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS			
ESTAMPILLA PRO CULTURA			
<b>SUBTOTAL IMPUESTOS</b>			
<b>COSTO TOTAL INTERVENTORIA</b>			-
